

Modernización del Segundo Periférico de Gómez Palacio - Torreón.


Características de la obra:

- Construcción a 4 carriles de circulación 5.4 km, 2 distribuidores a desnivel: Gregorio García (3 tramos) km 2+600 y El Vergel km 11+000, 2 PSV, 1 PIV y Puente (Unión Santa Rita km 0+000).

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: SEP-2013	TÉRMINO: DIC-2019
MONTO Y META TOTAL	1,022.9 MDP	5.4 km, 2 Distribuidores, 2 PSV, 1 PIV y 1 Puente
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	1,022.9	5.4 km, 2 Distribuidores, 2 PSV, 1 PIV y 1 Puente
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	31.2	O.C. (Alumbrado)

AVANCE GLOBAL (%)	
Avance físico:	100.0
Avance financiero:	100.0

ELEMENTOS TELAS	
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible
Económica (Registro UI-SHCP)	Calendario Fiscal Concluido (13096300010)
Legal (Derecho de Vía)	Disponible
Ambiental	Disponible
Social	Conciliar la instalación del alumbrado por parte del Gobierno del Estado.

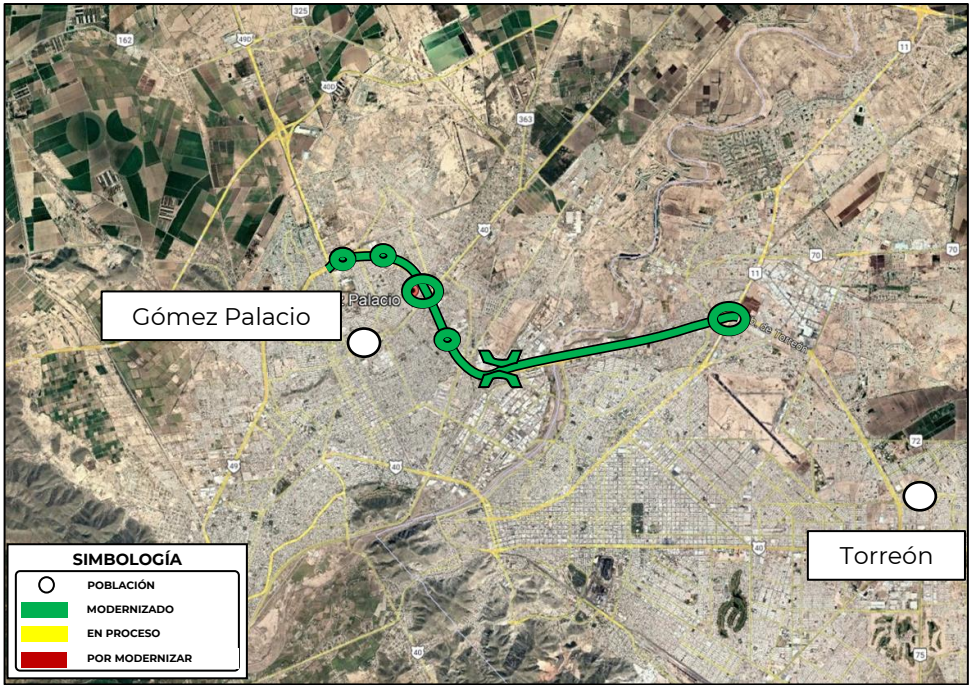

Beneficios:

- **Ahorro en tiempo:** 20 minutos.
- **Población beneficiada:** 1,212,269 habitantes de los municipios de Gómez Palacio, Torreón y Lerdo.
- **Empleos directos:** 2,213
- **Empleos indirectos:** 8,851
