

Características de la obra:

- Esta ubicada en el municipio de La Yesca, al sureste del estado de Nayarit y cuenta con una longitud total de 71.4 km.


MODERNIZACIÓN DE 71.4 KM		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2020	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	319.6 MDP	71.4 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
Hasta 2020	0.0 (Modernizado C.F.E.)	34.3
PEF 2021	59.5	12.4 (a nivel de base impregnada)
	260.1	24.7

Avance Global al 02 de mayo de 2023	
Avance físico:	100.0 %
Avance financiero:	100.0 %*
*No incluye el monto de los 34.3 km pavimentados por C.F.E.	

Estrategia de construcción:

- En 2021 se realizó la colocación de carpeta en 12.4 km y la modernización en 24.7 km.
- Los trabajos 2021 se contrataron con un periodo de ejecución del 01 de febrero al 28 de octubre.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

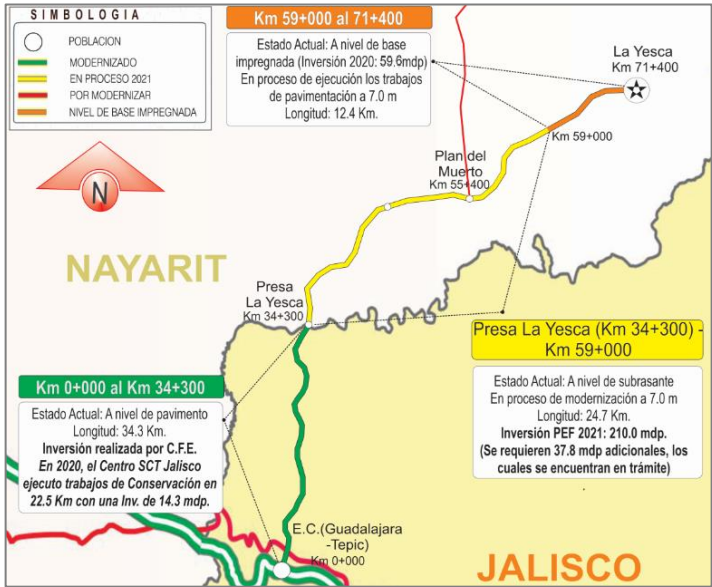

- Obra concluida en el ejercicio 2021.
- Beneficios:
- Se integró la región de la Yesca con el Corredor México 15.
- La población beneficiada es de 700 habitantes de la cabecera municipal de la Yesca y localidades aledañas al camino.
- Se redujo el tiempo de recorrido de 2 horas a 50 minutos.



PRESA LA YESCA – PLAN DEL MUERTO – LA YESCA
