

**Características de la obra:**

- Se ubica en el km 7+100, sobre el camino: km 126+300 E.C. (Huajuapán-oaxaca) - La joya - San Andrés Nuxiño, en el municipio de San Andrés Nuxiño, distrito de Nochixtlán del estado de Oaxaca y cuenta con una longitud de 15.6 m.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON 15.6 METROS.


PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	4.9 MDP	15.6 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( m )
Hasta 2020	0.0	0.0
2021	4.9	15.6

Avance Global al 02 de mayo de 2023	
Avance físico:	100.0 %
Avance financiero:	100.0 %

**Estrategia de construcción:**

- La obra cuenta con un claro con un ancho de calzada de 7.0, parapetos SCT T-34.4.1 y banquetas de 1.0 m, formando un ancho total de 9.0 m; dando servicio a dos carriles de circulación.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

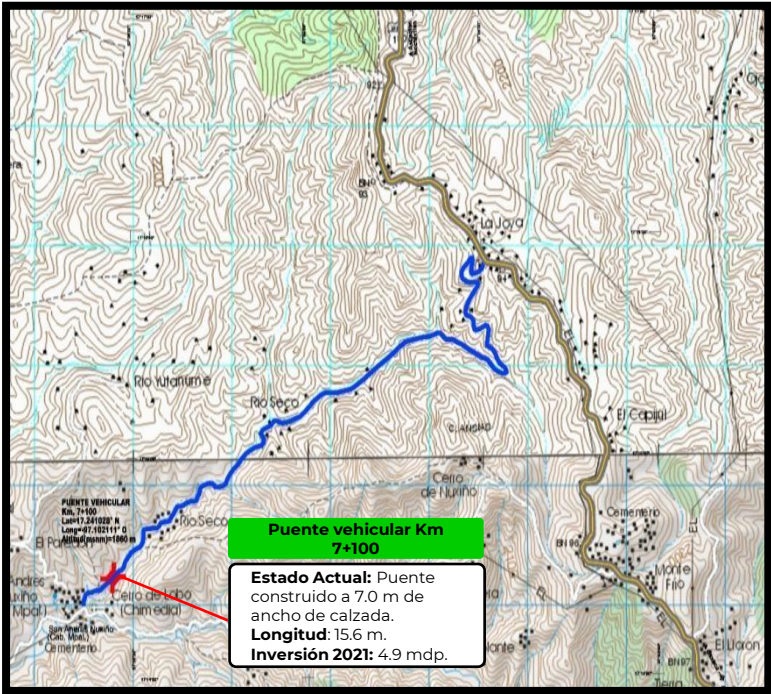

- La obra se contrató con periodo de ejecución del 16 de junio al 15 de octubre de 2021.
- Obra concluida en el ejercicio 2021.

**Beneficios:**

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 4,880 habitantes del municipio de San Andrés Nuxiño.



**km 126+300 E.C.(Huajuapán - Oaxaca) –  
La Joya - San Andrés Nuxiño,  
Puente en el km 7+100**



Latitud: 16.969093  
Longitud: -96.027385  
Elevación: 1908.7499 m  
Precisión: 15.0 m  
Tiempo: 03-30-2021 16:33  
Nota: Camino: Rancho Hormiga  
Est: 24580  
Vist: Adel

Powered by No

