

Características de la obra:

- Se ubicado en el Km 6+500 sobre el Camino: E.C. (Yucudaa- San Pedro Teposcolula) - San Vicente Nuñu en la región noreste del estado de Oaxaca en el municipio de Santa María Tataltepec y cuenta con una longitud de 25.0 m.


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON 25.0 METROS.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	10.8 MDP	25.0 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
Hasta 2020	0.0	0.0
Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de construcción:

- La obra cuenta con una sección de 9.0 m, con un ancho de calzada de 7.0 m, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno (1 carril de circulación por sentido) en ambos sentidos, con banquetas de 1.0 m en ambos lados.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

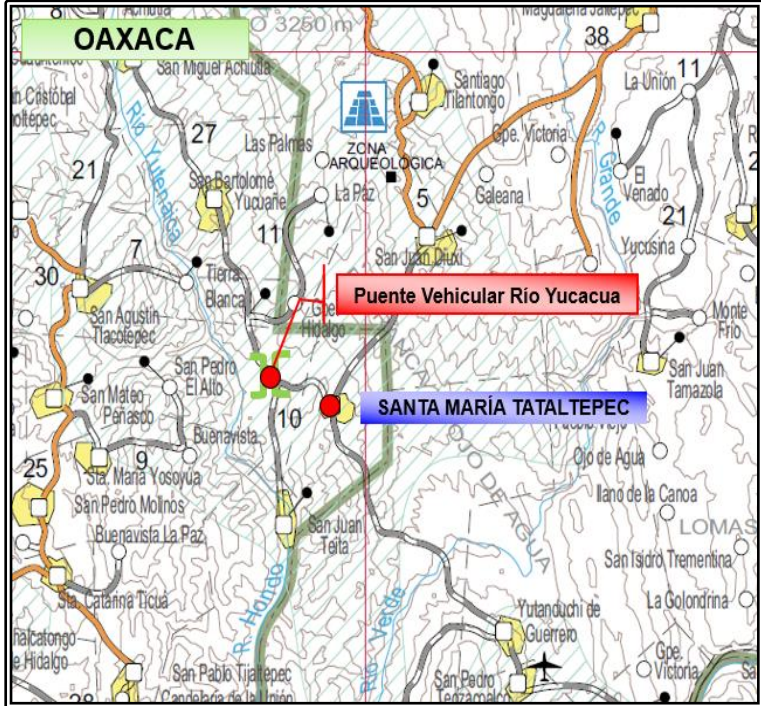

- La obra se contrató con periodo de ejecución del 01 de junio al 28 de octubre de 2021.
- Obra concluida en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 2,238 habitantes de los municipios de Santa María Tataltepec y Cerro San Marcos.

**E.C. (Yucudaa- San Pedro
Teposcolula) – San Vicente Nuño,
Puente en el Km 6+500**

