

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023


Características de la obra:

- Se modernizo de 4.0 m. a 7.0 m de ancho de corona para alojar dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno, así como un libramiento a 7.0 m. de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación, esta obra esta ubicada en el municipio del Nayar.

17.0 KM MODERNIZADOS		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2014	TÉRMINO: 2019
MONTO Y META TOTAL	111.7 MDP	17.0 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( Km )
Hasta 2018	50.4	3.2
2019	61.3	13.8

Avance Global al 02 de mayo de 2023	
Avance físico:	100.0 %
Avance financiero:	100.0 %

Elementos TELAS	
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %
Económica (Registro UI-SHCP)	13096380021
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 %
Social	Sin problema

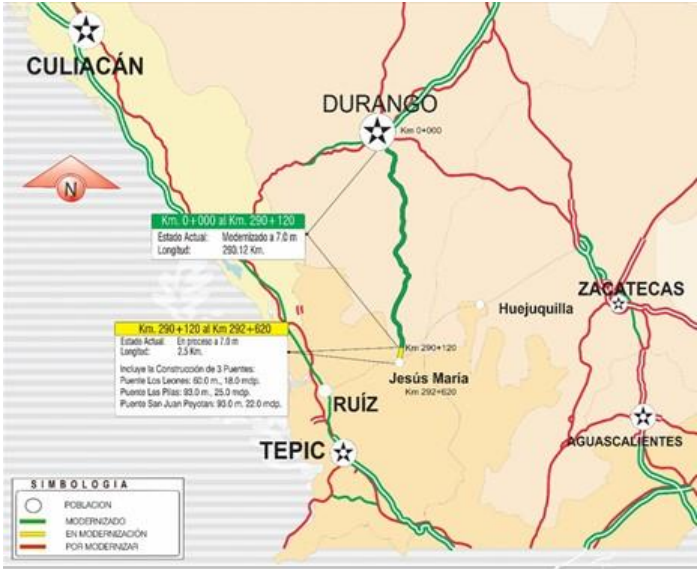

Beneficios:

Con la modernización de este camino se logro aumentar la seguridad del usuario y mejorar los costos de operación de este tramo por el que transitan, por lo que ahora es mas seguro, brinda un mejor servicio y permite el acceso a bienes y servicios, combatiendo con ello el grado de marginación que se tiene en la región, el último tramo modernizado, permite el acceso a las comunidades de San Juan Peyotan, Rancho Viejo, El Pastor y El Arco, localidades consideradas por la CONAPO con un alto grado de marginación.

Población Beneficiada: 540 habitantes.



**L.E. (Durango- Nayarit)-San Juan Peyotán-El Pastor**
