

Características de la obra:

Se ubica en el km 26+250 del del camino rural Río Ocotepec - Santa María Yucuhiti, en el municipio de Santa María Yucuhiti, distrito de Tlaxiaco, Oaxaca y cuenta con una longitud de 17.0 m.


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON 17.0 METROS.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	5.5 MDP	17.0 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
Hasta 2020	0.0	0.0
2021	5.5	17.0

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de construcción:

 La obra cuenta con un ancho de calzada de 7.0 m., en donde se alojan 2 carriles de 3.5 m. cada uno, banqueta de 0.75 m en ambos lados y parapetos de 25 cm. en ambos lados. Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

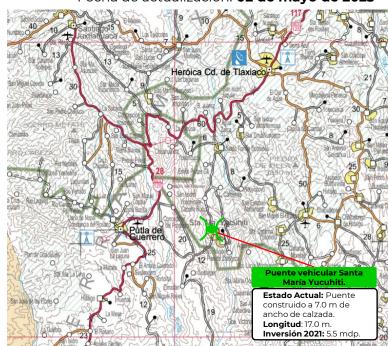

- La obra se contrató con un periodo de ejecución del 02 de julio al 29 de octubre de 2021.
- Obra concluida en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 7,868 habitantes del municipio de Santa María Yucuhiti

