

Características de la obra:

- Este proyecto se ubica en el en el sur-sureste del país en el municipio de Santo Domingo Tehuantepec, en el estado de Oaxaca y cuenta con una longitud total de 3.8 km.

MODERNIZAR 3.8 KM, DEL KM 0+000 AL KM 3+800


PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	12.1 MDP	3.8 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (Km)
PEF 2021	12.1	3.8

Avance Global al 02 de mayo de 2023	
Avance físico:	100.0 %
Avance financiero:	100.0 %

Estrategia de modernización:

- La obra cuenta con 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno.
- La obra fue contratada con un periodo de ejecución del 22 de septiembre al 23 de diciembre de 2021.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

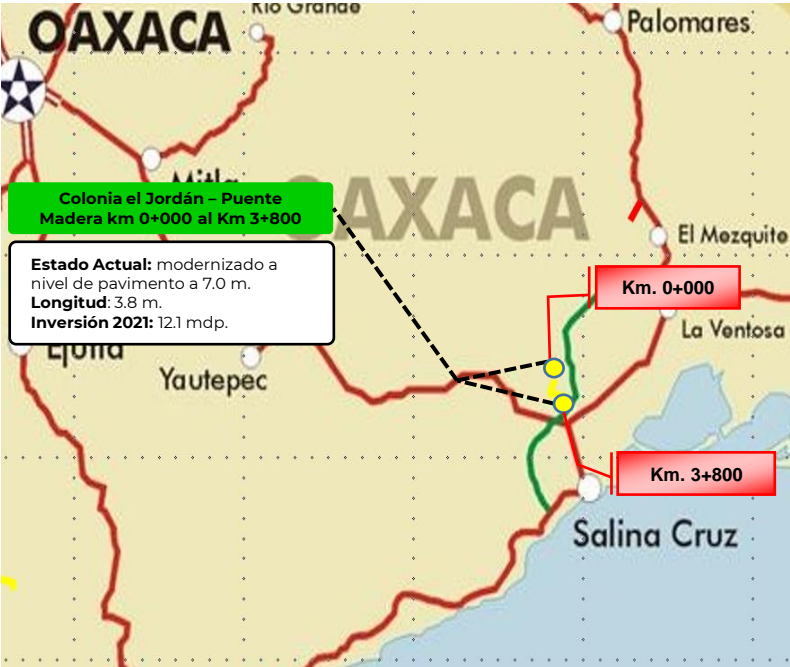

- Obra concluida en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- La población beneficiada es de 1,089 habitantes de las localidades de Colonia Jordan y Puente Madera.
- Se redujo el tiempo de recorrido de 7 minutos a 4 minutos.

Colonia Jordán - Puente Madera

