PUE. Puebla-Atlixco, Tr. Periférico Ecológico-Atlixco

Características de la obra:


Modernización de 9.5 km, de 21.0 a 37.0m de ancho de corona en los primeros 0.93 km, los siguientes 8.57 km de 12.0 a 22.0 m, para alojar 4 carriles de circulación incluye la construcción de 3 PSV's y un colector pluvial.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Feb 2012	Término: Dic 2021
MONTO Y META TOTAL	594.8 mdp	9.53 km, 3 PSV y 1 colector pluvial
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2021	594.8	9.53 km, 3 PSV y 1 colector pluvial
PEF 2022	0.0	0.00
Posterior a 2022	0.0	0.00

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%	
Económica (Registro UI-SHCP)	Disponible hasta 2023 (12096410023)	
Legal (Derecho de Vía)	Liberado al 100%.	
Ambiental	Disponible 100%	
Social	Sin problemática social	



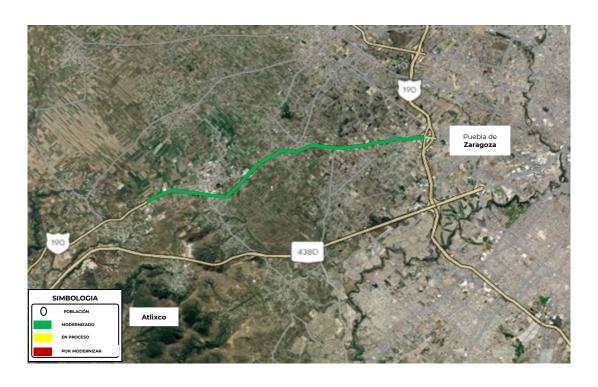

Beneficios:

• Ahorro en tiempo: 15 minutos

• **Población beneficiada:** 1,767,320 habitantes de los municipios de Atlixco, comunidades de Sa Bernardino, Chipilo de Francisco Javier Mina.

• Empleos directos: 1,509

• Empleos indirectos: 6,036
