OAX - Construcción de Puente en el Km 11+020 del Camino: Km 140. E.C (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Las Maravillas - Los Ángeles.



Características de la obra:

Este proyecto se ubica en la región Noreste del Estado de Oaxaca y pertenece al Municipio de Matías Romero Avendaño. Cuenta con una longitud total de 60.0 m.

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE EN KM 11+020 CON 60.0 M.


PERIODO DE	INICIO:	TÉRMINO:
EJECUCIÓN	2021	2021
MONTO Y META TOTAL	14.4 MDP	60.0 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
PEF 2021	14.4	60.0

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
ance financiero:	100.0 %	

Estrategia de modernización:

- La obra cuenta con 7.00 m de ancho de calzada, para alojar dos carriles de circulación de 3.50 m de ancho cada uno y banquetas de 1.00 m (cada lado).
- La obra fue contratada con un periodo de ejecución del 26 de octubre al 22 de diciembre de 2021, con esto se programa concluir la obra al 100% en el presente ejercicio fiscal.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

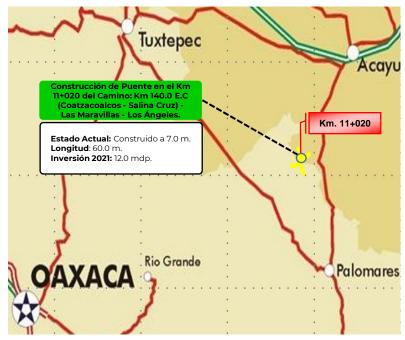

• Obra concluida en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- La población beneficiada es de 1,461 habitantes de las localidades de El Paso de las Maravillas y Los Ángeles.
- Se reducirá el tiempo de recorrido de 0.10 minutos a 0.04 minutos.



Puente ubicado en el km 11+020 en el camino: km 140.0 E.C. (Coatzacoalcos - Salina Cruz) - Las Maravillas - Los Angeles
