B.C. San Felipe – Laguna de Chapala, tramo: Campos Los Olivos - Puertecitos




Características de la obra:

 Construcción a 9.0 metros de ancho de corona para alojar 2 carriles de circulación de 3.5 metros y acotamientos laterales de 1.0 metros.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2019	Término: Dic-2021
MONTO Y META TOTAL	111.7 mdp	6.5 km, 2 Puentes, 1 Entronque
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	111.7	6.5 km, 2 Puentes, 1 Entronque
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS			
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%		
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2020 (12096220027)		
Legal (Derecho de Vía)	Liberado 100%.		
Ambiental	MIA autorizada No. SGPA∕DGIRA.DG.0117.09		
Social	Sin problemática social		

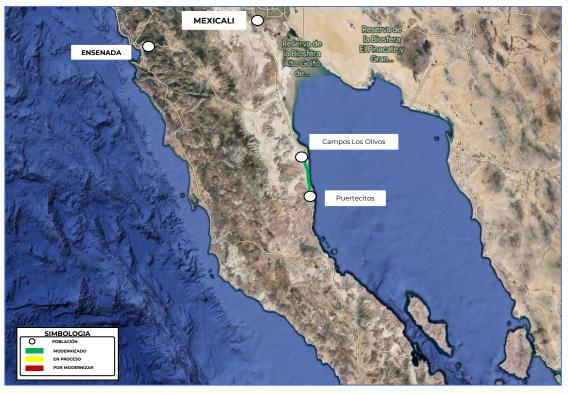

Beneficios:

• Ahorro en tiempo: 8 minutos.

• **Población beneficiada:** 100,000 habitantes del municipio de San Felipe.

Empleos directos: 177Empleos indirectos: 709
