

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

Características de la obra:

Esta obra se localiza en el municipio de Gómez Palacio, en la región centro norte del estado de Durango, se modernizó a 18.0 m de ancho de corona, para alojar cuatro carriles de circulación dos por sentido de 3.5 m de ancho cada uno, acotamientos internos de 1.0 m y acotamientos externos de 1.0 m.


19.4 KM MODERNIZADOS

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2010	TÉRMINO: 2019
MONTO Y META TOTAL	215.3 MDP	19.4 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (Km)
Hasta 2018	192.2	17.9
2019	23.1	1.5

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %	
Económica (Registro UI-SHCP)	10096300008	
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %	
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 %	
Social	Sin problema	

Problemática: No presenta

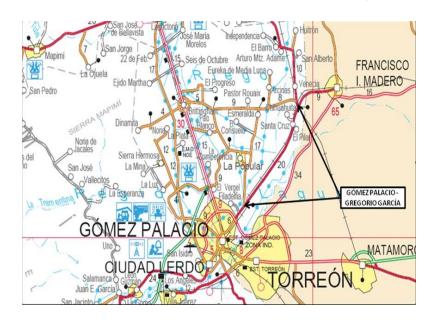

Beneficios:

- Actualmente se cuenta con la infraestructura adecuada para accesar a los servicios básicos, adicionalmente de brindar una operación apropiada a los usuarios, menores costos de operación, menores tiempos de recorrido y una mayor seguridad. Se brinda acceso a las comunidades de Gregorio García, Jiménez, Arturo Martínez Adame, El Barro.
- Se redujo el tiempo de recorrido de 25 minutos a 15 minutos
- Población Beneficiada: 257,352 habitantes.



