

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

Características de la obra:


■Esta obra esta ubicada en el municipio de Campeche, en la región norte del estado de Campeche, cuenta con una longitud de 33.6 km y una sección transversal de 9 m de ancho de corona, que aloja 2 carriles de circulación de 3.5 m de acho cada uno, para cada sentido y acotamientos laterales de 1.0 m.

MODERNIZACIÓN DE 33.6 KM

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2018	TÉRMINO: 2019
MONTO Y META TOTAL	238.9 MDP	33.6 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (Km)
Hasta 2018	179.5	25.0

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %	
Económica (Registro UI-SHCP)	18096240001	
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %	
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 %	
Social	Sin problema	

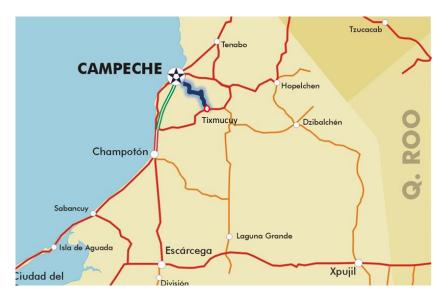

Beneficios:

- Cuenta con la infraestructura adecuada para poder accesar a los servicios básicos para la población, brindando una operación apropiada a los usuarios lo cual repercute en menores costos de operación, menores tiempos de recorrido y una mayor seguridad a los usuarios, teniendo como resultado que las actividades productivas se incrementaron, mejorando la calidad de vida de los habitantes de la región y lo cual repercute en una mayor competitividad del transporte de la región.
- Se redujo el tiempo de recorrido al pasar de 65 minutos a 30 minutos
- Población Beneficiada: 1,909 habitantes.



