YUC. Distribuidor Vial Salida a Progreso km 32+000

Características de la obra:


 Construcción de un PSV (690 m) de la carretera Mérida – Puerto Progreso, integrado por 2 estructuras paralelas con ancho de sección de 14 metros, para alojar 3 carriles de circulación por sentido, banquetas y parapetos cada una.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Nov-2017	Término: Sep-2018
MONTO Y META TOTAL	170.4 mdp	1 PSV
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	170.4	1 PSV
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2021 (16096510001)	
Legal (Derecho de Vía)	Liberado 100%.	
Ambiental	Exención autorizada No. 31/DC-0130/12/15	
Social	Sin problemática social	



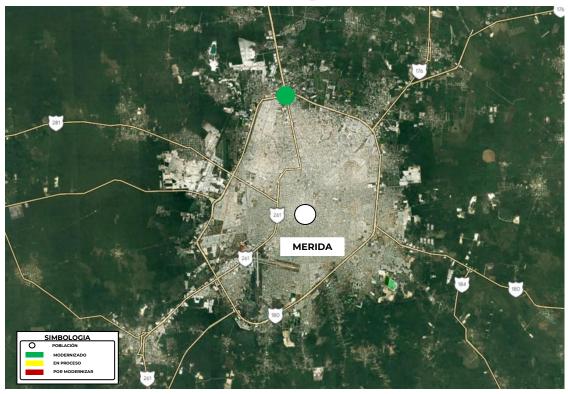

Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 15 minutos.
- **Población beneficiada:** 950,000 habitantes del municipio de Mérida.
- Empleos directos: 149Empleos indirectos: 447

