OAX. Puente Huautla.

COMUNICACIONES SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES

Características de la obra:

- Se ubica en el km 14+800 del camino: San Miguel Huautla - San Miguel Chicahua, al suroeste de la cabecera municipal de San Miguel Huautla del distrito de Nochixtlán del Estado de Oaxaca.
- El puente cuenta con una longitud de 25.0 m.


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON 25.0 METROS.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	8.0 MDP	25.0 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
Hasta 2020	0.0	0.0
2021	8.0	25.0

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de modernización:

 La obra cuenta con un claro de 20.0 m, ancho de calzada de 7.0 m, parapetos metálicos SCTT-34.4.1 y banquetas de 1.00 m, formando un ancho total de 9.0 m; dando servicio a dos carriles de circulación. Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

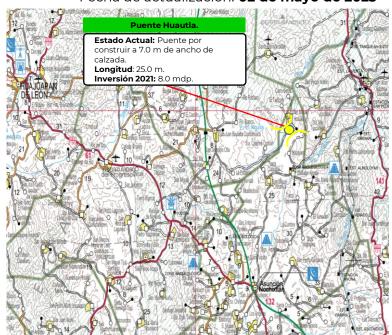

- La obra se contrató con un periodo de ejecución del 01 de julio al 28 de octubre de 2021.
- **Obra concluida** en el presente ejercicio.

Beneficios:

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 1,085 habitantes del Municipio de San Miguel Huautla.



