

Construcción del PSV Entronque Benjamín Hill – Costerita.


Características de la obra:

- Construcción del Paso Superior Vehicular Benjamín Hill – Costerita km 6+940 con tres claros alojando 4 carriles de circulación, incluye terraplenes de acceso y calles laterales sobre el Libramiento Sur de Culiacán.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: NOV-2017	TÉRMINO: MAY-2019
MONTO Y META TOTAL	130.6 MDP	PSV
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	130.6	PSV
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)	
Avance físico:	100 %
Avance financiero:	100 %

Elementos TELAS	
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible
Económica (Registro UI-SHCP)	17096450001 (Calendario Concluido)
Legal (Derecho de Vía)	Disponible
Ambiental	Disponible
Social	Disponible

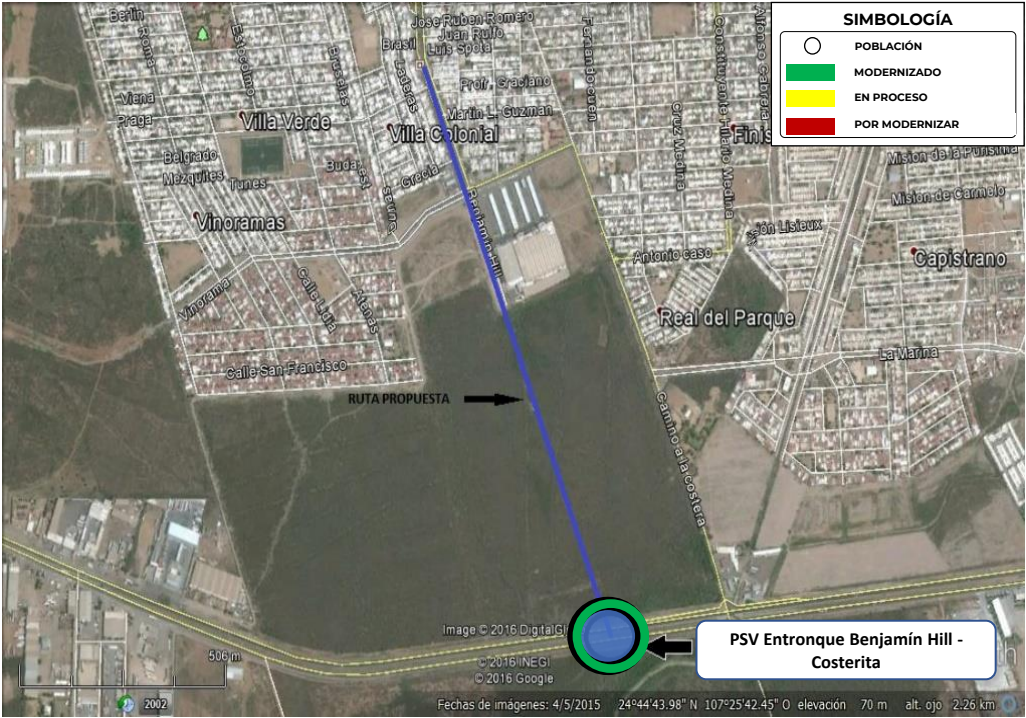

Beneficios

- Ahorro en tiempo:** 5 minutos
- Población beneficiada:** 905,265 habitantes del municipio de Culiacán.
- Empleos directos: 260
- Indirectos: 1,038.

