Puente "El 80" del Municipio de Ruíz



Características de la obra:

 Esta ubicado en el municipio de Ruíz, al nortecentro del estado de Nayarit y cuenta con una longitud total de 880 m (incluyendo accesos).


CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "EL 80" CON 880 M.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	54.6 MDP	880.0 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
Hasta 2020	0.0	0.0
PEF 2021	54.6	880.0

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Av <mark>a</mark> nce físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de construcción:

 Obra contratada con un periodo de ejecución del 01 de febrero al 08 de julio de 2022, a la fecha la obra se encuentra concluida al 100%. Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

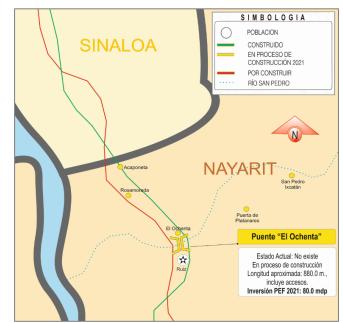

Beneficios:

- Comunica directamente a la comunidad de El Ochenta con la cabecera municipal de Ruíz.
- La población beneficiada es de 805 habitantes de las cabeceras municipales de Ruíz, Rosamorada y localidades aledañas al camino.
- Se redujo el tiempo de recorrido de 30 minutos a 5 minutos.



