

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023


Características de la obra:

 Esta obra esta ubicada en el municipio de Chilcuautla, en el estado de Hidalgo, cuenta con una longitud total de 7.3 km con 7.0 m de ancho de corona y aloja 2 carriles de circulación de 3.50m de ancho cada uno.

7.3 KM MODERNIAZADOS		
PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2018	TÉRMINO: 2019
MONTO Y META TOTAL	37.1 MDP	7.3 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (Km)
Hasta 2018	13.8	4.0
2019	23.3	3.3

Avance Global al 02 de mayo de 2023	
Avance físico:	100.0 %
Avance financiero:	100.0 %

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	100.0 %	
Económica (Registro UI-SHCP)	19096330002	
Legal (Derecho de Vía)	100.0 %	
Ambiental	MIA 100.0 %, CUS 100 %	
Social	Sin problema	

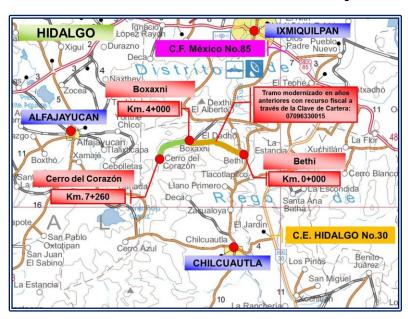

Beneficios:

- Comunica a las localidades Bethí, Boxaxni y Cerro del Corazón, se facilitó el acceso a otros bienes y servicios encontrados en localidades aledañas, así como se mejoró la distribución de mercancías y la reducción de tiempo de recorrido, además comunica con la Cabecera Municipal de Chilcuautla y con la Carretera Estatal Hidalgo.
- Se redujo el tiempo de recorrido de 9 minutos a 4 minutos.
- Población Beneficiada: 1,114 habitantes.











