# OAX. E.C. Km 126+645 (Mitla - Tehuantepec II) - San Juan Juquila Mixes.



#### Características de la obra:

Se ubica en el municipio de Juquila Mixes, al sureste del Estado de Oaxaca, tiene una longitud de 27.4 km que requieren trabajos de modernización, hasta 2020 se tiene 9.9 km a nivel de pavimento.

#### **MODERNIZAR 27.3 KM**


PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2020	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	63.7 MDP	27.3 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN ( mdp )	META ( km )
2020	12.6	9.9
2021	51.1	17.5

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

## Estrategia de modernización:

- Su modernización se realizó a nivel de pavimento.
- Obra contratada con un periodo de ejecución del 10 de septiembre al 08 de julio de 2022.
- Obra concluida en el presente ejercicio.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

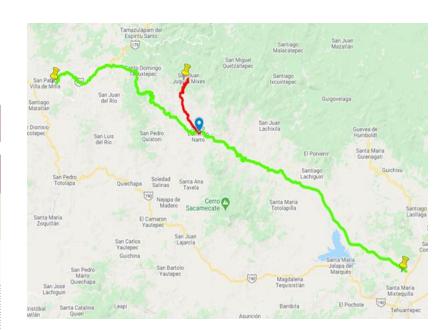

### **Beneficios:**

- Disminución de la marginación de la región.
- Se integró a las comunidades aisladas de la región para su desarrollo económico y social.
- La población beneficiada es de 2,884 habitantes de la cabecera municipal y localidades.

