Modernización de la Carretera Jalpa – Límite de Estados Zac./Ags.

Características de la obra:


 Modernización de la carretera existente, de 7 a 12 m de ancho de corona, para alojar 2 carriles de circulación de la carretera Jalpa - Calvillo.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: OCT-2013	TÉRMINO: DIC-2020
MONTO Y META TOTAL	474.9 MDP	24.8
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	474.9 MDP	24.8
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	

AVANCE GLOBAL (%)		
Avance físico:	100 %	
Avance financiero:	100 %	

ELEMENTOS TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible	
Económica (Registro UI- SHCP)	Calendario Fiscal Concluido	
Legal (Derecho de Vía)	Disponible	
Ambiental	Disponible	
Social	Disponible	



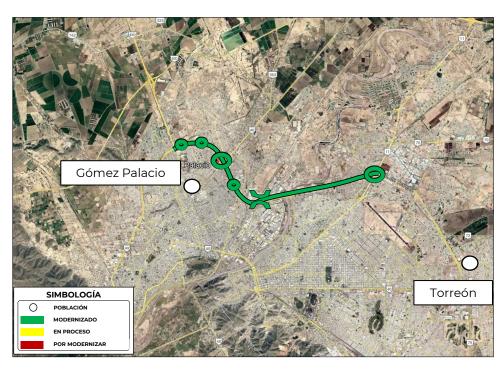

Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 5 minutos.
- **Población beneficiada:** 907,369 habitantes en los municipios de Apozol, Jalpa y Aguascalientes.
- Empleos directos: 1,175
- Empleos indirectos: 4,698

