

Fecha de actualización: **02 de mayo de 2023**Características de la obra:

Se ubica en el km 37+280 del camino: E.C. (Pinotepa Nacional - Pochutla) - Sn José De Las Flores - El Duraznal - Santiago Ixtayutla, en el municipio de Santiago Ixtayutla, Oaxaca, cuenta con una longitud de 51.2 m.


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE CON 51.2 METROS.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	12.7 MDP	51.2 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
Hasta 2020	0.0	0.0
2021	12.7	51.2

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de construcción:

 La obra cuenta con un ancho de calzada de 7.0 m., en donde se alojan 2 carriles de 3.7 m. cada uno, banqueta de 1.0 m en ambos lados, parapetos de 25 cm. en ambos lados y claro máximo de 25.0 m. y claro mínimo de 25.0 m.

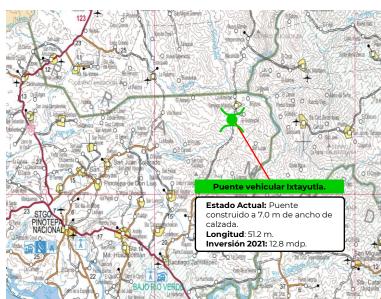

- La obra se contrató con un periodo de ejecución del 01 de junio al 11 de diciembre de 2021.
- Obra concluida en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 12,227 habitantes del municipio de Santiago lxtayutla.

