Boulevard Las Torres

Características de la obra:


 Ampliación del Boulevard a cuatro carriles de circulación, mediante la construcción de 1 cuerpo paralelo al existente de 10.5 m con dos carriles de 3.5 m. y acotamientos laterales de 2.5 m. e interiores de 1.0 m.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Ju1-2013	Término: Oct-2018
MONTO Y META TOTAL	165.5 mdp	6.7 km
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	165.5	6.7
PEF 2023	0.0	=
		

Avance Glo	Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0		
Avance financiero:	100.0		

Elementos TELAS			
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible		
Económica (Registro UI-SHCP)	Registro No. 11096330021 Depurado		
Legal (Derecho de Vía)	Disponible		
Ambiental	Disponible		
Social	Sin Problemática		



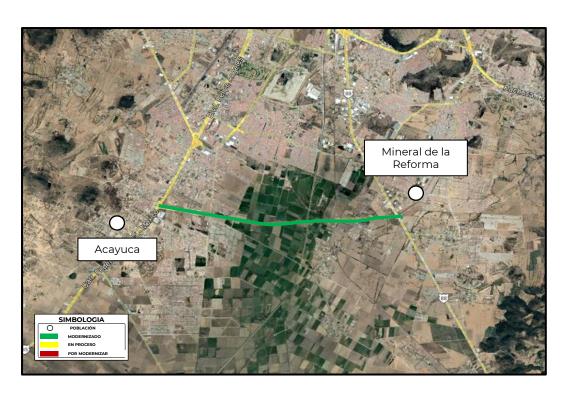

Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 5 minutos.
- Población beneficiada: 300,000 habitantes de los municipios de Pachuca, Mineral de la Reforma y Zapotlán de Juárez.
- Empleos directos: 166
- Empleos indirectos: 498

