OAX. San Pedro y San Pablo Ayutla - Cerro Costoche - San Juan Juquila Mixes.



Características de la obra:

 Se ubica en el municipio de Juquila Mixes, al sureste del estado de Oaxaca tiene una longitud de 23.0 km.

MODERNIZACIÓN DE 23.0 KM


PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2020	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	29.3 MDP	23.0 KM
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km)
2020	12.7	10.0(nivel de Pavimento y Base Impregnada) 6.5 (terracería)
2021	16.6	6.5 (terracería)

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
	Avance físico:	100.0 %
	Avance financiero:	100.0 %

Estrategia de modernización:

- Su modernización se realizó a nivel de subrasante, su pavimentación se realizará a través del U004.
- En el ejercicio 2021, con cargo al U004 se pavimentaron 4.0 km, para el presente ejercicio de tiene contemplado pavimentar 5.0 km.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

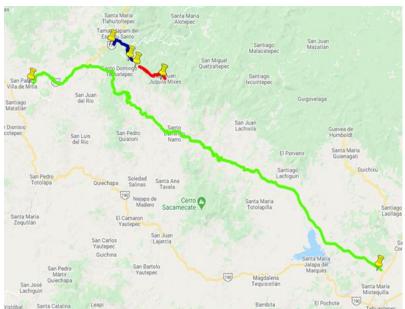

- Los trabajos 2021 se contrataron con un periodo de ejecución del 12 de abril al 9 de agosto de 2021.
- Obra concluida a nivel de subrasante en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- Disminuir la marginación de la región.
- Integrar las comunidades aisladas en la región para su desarrollo económico y social.
- La población beneficiada es de 1,609 habitantes de la cabecera municipal y localidades.



