OAX - Puente vehicular Santo Domingo Narro ubicado en el Km. 2+260 de Camino Km. 125+000 E.C. (Oaxaca-Tapanatepec)-Santo Domingo Narro.



Características de la obra:

 Este proyecto se ubica en la región Sureste del estado de Oaxaca en el municipio de San Juan Juquila Mixes y cuenta con una longitud total de 36.85 m.


CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE "NARRO" CON 36.85 M.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	13.7 MDP	36.85 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
PEF 2021	13.7	36.85
Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de construcción:

- La obra cuenta con un ancho de corona total de 9.00 m; para alojar dos carriles de circulación (un carril de circulación por sentido) con banquetas y guarniciones de 1.00 m a cada lado.
- La obra se contrató con un periodo de ejecución del 27 de agosto al 08 de julio de 2022.

Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

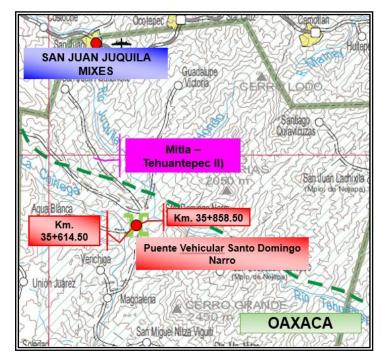

• Obra concluida en el ejercicio 2021.

Beneficios:

- La población beneficiada es de 489 habitantes de las localidades de Santo Domingo Narro y Guadalupe Lachiriega.
- Se tiene un ahorro en el tiempo de recorrido de 2 min.



