

Características de la obra:

Se ubica en el km 0+183.10 sobre el camino: E.C. (Oaxaca - Tehuantepec)- Santa María Zoquitlán, en la región sureste del estado de Oaxaca, en el municipio de San Pedro Totolapan.


CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE RIO SECO CON 56.9 METROS.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: 2021	TÉRMINO: 2021
MONTO Y META TOTAL	12.7 MDP	56.9 M
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (m)
Hasta 2020	0.0	0.0
2021	12.7	56.9

Avance Global al 02 de mayo de 2023		
Avance físico:	100.0 %	
Avance financiero:	100.0 %	

Estrategia de construcción:

 El puente cuenta con una sección de 9.0 m, un ancho de calzada de 7.0 m, que aloja dos carriles de circulación de 3.5 m. cada uno (1 carril de circulación por sentido) en ambos sentidos y banquetas de 1.0 m en ambos lados. Fecha de actualización: 02 de mayo de 2023

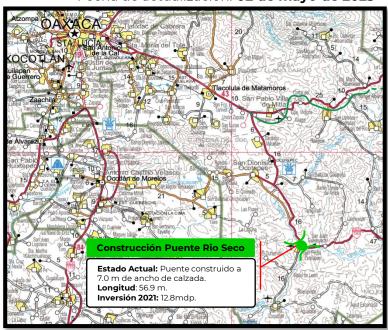

- La obra se contrató con un periodo de ejecución del 26 de junio de 2021 al 08 de julio de 2022.
- Obra concluida en ejercicio 2021.

Beneficios:

- Se impulsó el desarrollo social y económico de una región considerada de muy alta marginación.
- La población beneficiada es de 4,937 habitantes del Municipio de San Pedro Totolapán.









