B.C. Puentes Vehiculares del Cruce Fronterizo Mexicali – Río Nuevo

Características de la obra:


Construcción de un PSV de 3 carriles de circulación a base de pilas, superestructura de vigas de acero, losa de concreto, muros mecánicamente estabilizados y obra complementaria; así como la construcción del Paso Deprimido Colón Oriente de 3 carriles de circulación, para el cruce del ferrocarril con muros de concreto armado y tablaestaca, obra complementaria y señalamiento.

PERIODO DE EJECUCIÓN	Inicio: Mar-2019	Término: Dic-2020
MONTO Y META TOTAL	272.5 mdp	1 Puente y 1 Paso Deprimido
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	272.5	1 Puente y 1 Paso Deprimido
PEF 2023	0.0	0.0
Posterior a 2023	0.0	0.0

Avance Global (%)		
Avance físico:	100.0	
Avance financiero:	100.0	

Elementos TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible 100%	
Económica (Registro UI-SHCP)	Vigente hasta 2021 (18096220001)	
Legal (Derecho de Vía)	Liberado 100%.	
Ambiental	Exención autorizada con oficio No. DFBC/SGPA/UGA/DGIRA/4210/10	
Social	Sin problemática social	



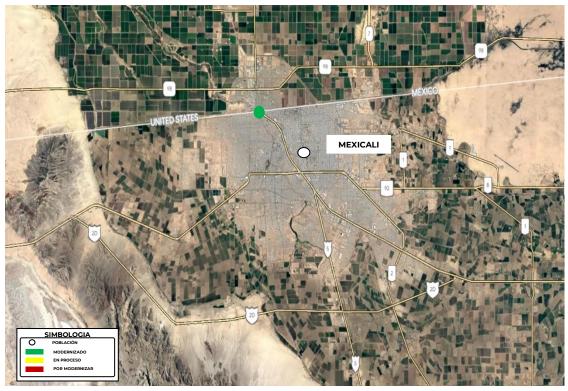

Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 60 minutos.
- **Población beneficiada:** 988,417 habitantes de los municipios de Mexicali.
- Empleos directos: 429
 Empleos indirectos: 1,714

