Paso Superior Vehicular Getsemaní

Características de la obra:


• El proyecto tiene lugar al oriente de la Cd. de Durango a la altura del kilómetro 274+300 del Libramiento Oriente de Durango y consiste en la construcción de un Paso Superior Vehicular (PSV) con longitud de 1.30 km sobre el actual Entronque Getsemaní.

PERIODO DE EJECUCIÓN	INICIO: MAR-2017	TÉRMINO: DIC-2019
MONTO Y META TOTAL	127.0MDP	PSV
EJERCICIO FISCAL	ASIGNACIÓN (mdp)	META (km - estructura)
Hasta 2022	127.0	PSV
·····	÷····	
PEF 2023	0.0	0.0

AVANCE GLOBAL (%)		
Avance físico:	100	
Avance financiero:	100	

ELEMENTOS TELAS		
Técnica (Proyecto Ejecutivo)	Disponible	
Económica (Registro UI- SHCP)	Calendario Fiscal Concluido (14096300003)	
Legal (Derecho de Vía)	Disponible	
Ambiental	Disponible	
Social	Disponible	



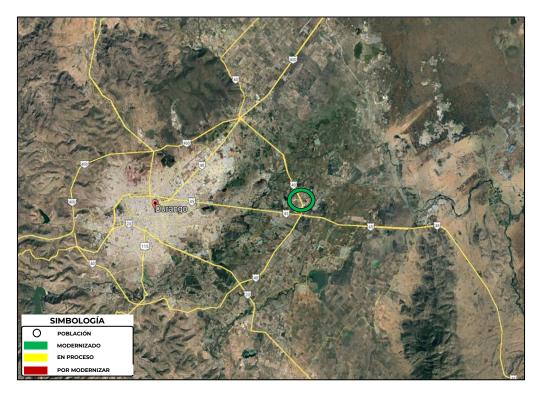

Beneficios:

- Ahorro en tiempo: 10 minutos.
- **Población beneficiada:** 654,876 habitantes de Villa Unión y Vicente Guerrero.
- Empleos directos: 275
- Empleos indirectos: 1,099

